



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 11/12/2024

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024
PERÍODO: 28/11/2024 à 10/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Atarson Nascimento da Lima
CREA - 211042483-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Matr.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO										
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	SALDO						
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO																	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$																
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$	92.195,81	1,00	0,33	0,03	0,36	0,54	R\$	58.019,284,89	R\$	18.466,861,43	R\$	1.489.304,20	R\$	19.933.165,63	R\$	38.004.119,28
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$							R\$	92.195,81	R\$	30.424,61	R\$	2.765,07	R\$	33.190,48	R\$	59.005,33
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_0392022_PS	R\$	384,86	60,00	48,00	48,00	12,00	23.091,60	R\$	489.935,92	R\$	382.613,27	R\$	2.181,34	R\$	384.994,61	R\$	144.936,91
1.2.2.	PROJETO EXECUTIVO (REF. CODEVASEF)	R\$	10.221,31	32,00	28,77	-	28,77	3,23	327.081,92	R\$	294.087,07	R\$	-	R\$	294.087,07	R\$	33.014,85	
1.2.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SIVAP 78472)	R\$	0,52	288.000,00	135.140,24	4.194,98	139.335,12	148.664,88	R\$	149.760,00	R\$	70.272,92	R\$	2.181,34	R\$	72.454,26	R\$	77.305,74
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$							R\$	4.457.297,03	R\$	1.056.224,77	R\$	83.683,60	R\$	1.140.908,37	R\$	3.309.398,71
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$	195,90	1.920,00	12,81	-	12,81	1.907,19	R\$	280.928,00	R\$	1.740,88	R\$	-	R\$	1.740,88	R\$	259.187,12
1.3.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	22,99	144.000,00	45.680,73	3.640,00	49.320,73	94.679,27	R\$	3.310.580,00	R\$	1.050.199,99	R\$	83.683,60	R\$	1.133.883,59	R\$	2.176.676,41
1.3.3.	REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA (REF. ORSE 04289)	R\$	214,21	840,00	80,00	-	80,00	580,00	R\$	197.094,40	R\$	12.852,60	R\$	-	R\$	12.852,60	R\$	124.241,80
1.3.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	R\$	10,43	21.252,19	12,81	-	12,81	21.239,38	R\$	221.560,34	R\$	133,61	R\$	-	R\$	133,61	R\$	221.526,73
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF_07/2020	R\$	2,48	212.521,91	128,10	-	128,10	212.393,81	R\$	527.054,34	R\$	317,69	R\$	-	R\$	317,69	R\$	526.736,65
1.4.	TERRAPLENAGEM	R\$							R\$	1.452.672,00	R\$	911.510,18	R\$	22.388,39	R\$	933.886,56	R\$	518.773,44
1.4.1.	Escavado, carga e transporte do material de 1ª categoria - DMT 4p 1.000 a 1.200 m - canhão de serviço pavimentado- com especificação e contêmbulo basculante de 14 m³	R\$	7,69	57.800,00	52.290,39	1.024,32	53.314,71	4.285,29	R\$	442.944,00	R\$	402.113,09	R\$	7.877,02	R\$	409.990,11	R\$	32.953,89
1.4.2.	Escavado de material em botafona	R\$	2,03	57.800,00	47.490,37	742,48	48.232,85	9.367,15	R\$	116.928,00	R\$	96.405,64	R\$	1.507,23	R\$	97.912,87	R\$	19.016,53
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$	3,10	288.000,00	133.223,11	4.194,88	137.417,99	150.592,01	R\$	892.800,00	R\$	412.991,85	R\$	13.004,13	R\$	425.995,78	R\$	466.804,22
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$							R\$	45.992.960,00	R\$	15.571.086,00	R\$	1.287.777,93	R\$	16.858.863,93	R\$	30.934.086,07
1.5.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVA SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	10,22	43.200,00	6.447,55	281,84	6.729,39	38.470,61	R\$	441.504,00	R\$	65.893,86	R\$	2.880,40	R\$	68.774,36	R\$	372.729,64
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BIRTA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	282,88	43.200,00	26.104,23	1.163,30	27.267,53	15.932,47	R\$	12.220.416,00	R\$	7.384.964,60	R\$	329.074,30	R\$	7.713.438,90	R\$	4.506.977,10
1.5.3.	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	R\$	226,15	28.800,00	3.643,70	-	3.643,70	25.156,30	R\$	6.801.120,00	R\$	880.459,77	R\$	-	R\$	880.459,77	R\$	5.940.660,23
1.5.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXÁNGULO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	R\$	85,67	288.000,00	73.353,90	10.820,28	84.174,18	203.825,82	R\$	24.672.960,00	R\$	6.294.228,62	R\$	928.973,39	R\$	7.211.202,01	R\$	17.461.757,99

TS. 2384 Proc. 142/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 11/12/2024

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024
PERÍODO: 28/11/2024 à 10/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as Normas Técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO

Alderson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-6 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³/KM, AF 07/2020)	R\$ 2,48	1.152,000,00	288.765,75	11.693,00	300.399,75	851.601,25	R\$ 2.856.980,00	R\$ 716.139,05	R\$ 28.849,84	R\$ 744.988,89	R\$ 2.111.971,11
1.6.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, DRENAAGEM	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 4.038.619,20	R\$ 720.275,74	R\$ 60.622,10	R\$ 780.797,84	R\$ 3.248.821,36
1.6.1.	MOLDADE, IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF. 06/2016	R\$ 211,93	1.440,00	-	-	-	1.440,00	R\$ 305.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.179,20
1.6.2.	Misto de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R\$ 35,21	98.000,00	18.017,78	1.490,00	19.507,78	76.492,22	R\$ 3.380.160,00	R\$ 634.406,03	R\$ 52.462,90	R\$ 686.868,93	R\$ 2.693.291,07
1.6.3.	ESCORAMENTO DE MIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 89718)	R\$ 5,52	64.000,00	17.186,54	1.460,00	18.646,54	45.353,46	R\$ 353.280,00	R\$ 94.889,71	R\$ 8.059,20	R\$ 102.928,91	R\$ 250.351,09
1.7.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 739162)	R\$ 110,52	64,00	-	-	-	64,00	R\$ 7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.073,28
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS, R. 11/2020	R\$ 996,43	256,00	-	-	-	256,00	R\$ 255.086,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.086,08
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 223.447,92	R\$ 35.506,88	R\$ 9.984,98	R\$ 45.491,86	R\$ 177.956,06
1.8.1.	AGRESSIVO PARA FOCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESCOTO, EM ALVENARIA COM TUDO OS CERRÂMICOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,9 M, AF. 12/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,68
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARCA MANUAL	R\$ 0,66	288.000,00	43.857,92	15.128,76	58.986,68	229.013,32	R\$ 190.090,00	R\$ 28.946,22	R\$ 9.994,88	R\$ 38.931,20	R\$ 151.148,80
1.8.3.	REDEADA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2/00), AF. 12/2020	R\$ 17,30	1.068,00	360,00	-	360,00	708,00	R\$ 18.476,40	R\$ 6.228,00	R\$ -	R\$ 6.228,00	R\$ 12.248,40
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 80 X 100 CM, INC. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	R\$ 1.995,84	R\$ 332,64	R\$ -	R\$ 332,64	R\$ 1.663,20
1.8.5.	PLACA DE FINANGIJAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO (CONFORME MODELO FROTIRO (REF. ORSE 31/87)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL SEM BDI			1,00	-	-	-	1,00	R\$ 47.432.377,80	R\$ 16.696.354,80	R\$ 1.201.197,03	R\$ 18.287.541,83	R\$ 31.134.825,67
VALOR DO BDI			-	-	-	-	-	R\$ 10.656.907,09	R\$ 3.369.506,55	R\$ 288.107,17	R\$ 3.657.613,70	R\$ 6.349.295,39
VALOR TOTAL FINAL			-	-	-	-	-	R\$ 58.079.284,89	R\$ 18.065.861,35	R\$ 1.489.304,20	R\$ 18.945.155,53	R\$ 37.484.121,06
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SSESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TS 2485 Proc. 442/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO



OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	 Alardson Nascimento de Lima CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2	
ENDEREÇO:	VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.		 Felipe Augusto Dantas de Oliveira CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498
PERÍODO:	26/11/2024 a 10/12/2024	CTEF Nº: 04/2024	CONCORRÊNCIA Nº: 14/2023 - SEINFRA

FOTO 1



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
----------------	-----------------------

FOTO 2



RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO - ALTO DO SUMARÉ

SERVIÇO:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
-----------------	-----------------------


FOTO 3



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO:	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
-----------------	--

FOTO 4



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO:	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE
-----------------	------------------------------


FOTO 5



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO:	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA
-----------------	---------------------------------------

FOTO 6



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO:	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO
-----------------	----------------------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	 Alaerdson Nascimento de Lima CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2	
ENDEREÇO:	VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.		 Felipe Augusto Dantas de Oliveira CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498
PERÍODO:	26/11/2024 a 10/12/2024	CTEF Nº: 04/2024	CONCORRÊNCIA Nº: 14/2023 - SEINFRA


FOTO 7



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO:	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA
-----------------	--

FOTO 8



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO:	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA
-----------------	------------------------------


FOTO 9



AV. VILLA JARDIM - BOM JESUS

SERVIÇO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
----------------	---

FOTO 10



RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO - ALTO DO SUMARÉ

SERVIÇO	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE
----------------	------------------------------

FOTO 11



RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO - ALTO DO SUMARÉ

SERVIÇO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
----------------	---

FOTO 12



RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO - ALTO DO SUMARÉ

SERVIÇO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO
----------------	----------------------------------



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	 Alaerdson Nascimento de Lima CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2	
ENDEREÇO:	VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.		 Felipe Augusto Dantas de Oliveira CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498
PERÍODO:	26/11/2024 a 10/12/2024	CTEF Nº: 04/2024	CONCORRÊNCIA Nº: 14/2023 - SEINFRA

FOTO 13

RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO - ALTO DO SUMARÉ

SERVIÇO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA
----------------	--

FOTO 14

RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO - ALTO DO SUMARÉ

SERVIÇO	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA
----------------	------------------------------

FOTO 15

RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO - ALTO DO SUMARÉ

SERVIÇO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA
----------------	---------------------------------------

FOTO 16

RUA JAGUAR - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 17

RUA JAGUAR - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 18

AV. CARLOS LIMA ROCHA - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
-----------------	---------------------------------------



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO


OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	 Alaerdson Nascimento de Lima CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2
ENDEREÇO:	VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	
PERÍODO:	26/11/2024 a 10/12/2024	CTEF Nº: 04/2024
CONCORRÊNCIA Nº: 14/2023 - SEINFRA		

FOTO 19



AV. CARLOS LIMA ROCHA - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 20



AV. CARLOS LIMA ROCHA - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ESCORAMENTO
----------------	------------------------------------

FOTO 21



RUA DO PINHÃO - ALTO DAS BRISAS

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 22



RUA DO PINHÃO - ALTO DAS BRISAS

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ESCORAMENTO
----------------	------------------------------------

FOTO 23



RUA DA MAMONA - ALTO DAS BRISAS

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 24



RUA DA MAMONA - ALTO DAS BRISAS

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ESCORAMENTO
-----------------	------------------------------------



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	 Alaerdson Nascimento de Lima CREA - 211042/83-4 / Mat.: 5096847-2
ENDEREÇO:	VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	
PERÍODO:	26/11/2024 a 10/12/2024	CTEF Nº: 04/2024
CONCORRÊNCIA Nº: 14/2023 - SEINFRA		

FOTO 25

RUA LAND ROVER - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO	LIMPEZA DE RUA
----------------	----------------

FOTO 26

RUA JAGUAR - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO:	LIMPEZA DE RUA
-----------------	----------------

FOTO 27

RUA INFINIT - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO	LIMPEZA DE RUA
----------------	----------------

FOTO 28

RUA FERRARI - NOVA MOSSORÓ

SERVIÇO:	LIMPEZA DE RUA
-----------------	----------------

FOTO 29

RUA MARIA DO CARMO FERNANDES MAIA

SERVIÇO	LIMPEZA DE RUA
----------------	----------------

FOTO 30

RUA NILZA PIRES DE ALMEIDA

SERVIÇO:	LIMPEZA DE RUA
-----------------	----------------

2701 149 18023 ✓



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO


OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	 Alaedson Nascimento de Lima CREA - 211042493-4 / Mat.: 5096847-2
ENDEREÇO:	VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	
PERÍODO:	26/11/2024 a 10/12/2024	CTEF Nº: 04/2024
CONCORRÊNCIA Nº: 14/2023 - SEINFRA		

FOTO 31



RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 32



RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 33



RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO
----------------	----------------------

FOTO 34



RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ESCORAMENTO
----------------	------------------------------------

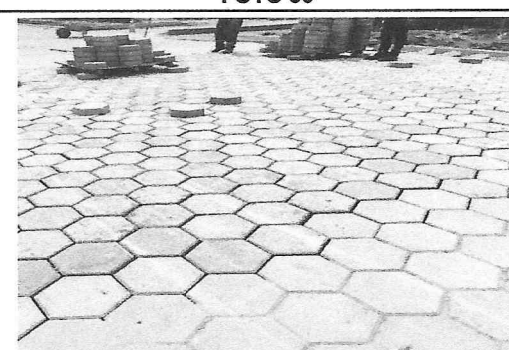
FOTO 35



RUA FRANCISCO MARCIEL DE LIMA

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO
----------------	----------------------

FOTO 36



RUA PROJETADA 03

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO
----------------	----------------------



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO


OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	 Alaerdson Nascimento de Lima CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2
ENDEREÇO:	VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	
PERÍODO:	26/11/2024 a 10/12/2024	CTEF Nº: 04/2024
CONCORRÊNCIA Nº: 14/2023 - SEINFRA		

FOTO 37



RUA PROJETADA 03

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO
----------------	----------------------

FOTO 38



RUA PROJETADA 03

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ESCORAMENTO
----------------	------------------------------------

FOTO 39



RUA JORGE ALVES DA SILVA

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

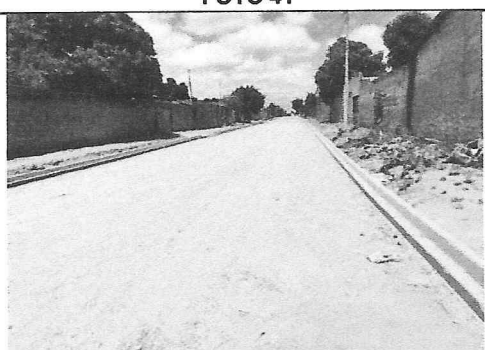
FOTO 40



RUA JORGE ALVES DA SILVA

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO
----------------	---------------------------------------

FOTO 41



RUA JORGE ALVES DA SILVA

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO
----------------	----------------------

FOTO 42



RUA JORGE ALVES DA SILVA

SERVIÇO	EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ESCORAMENTO
----------------	------------------------------------



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

ENDEREGO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

PERÍODO: 28/11/2024 à 10/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

Alaertson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)									
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	OBSERVAÇÕES
AV VILLA JARDIM	560,00	6,50				3.640,00	3.640,00			
RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO	69,36	8,00				554,88	554,88			
ACUMULADO ANTERIOR						135.140,24				
MEDIDO NO PERÍODO						4.194,88				
ACUMULADO NO PERÍODO						139.335,12				
M2									TOTAL:	4.194,88

Fls. 2493 Proc: 142 19023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERRAVIDO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 69.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

8ª MEDIÇÃO

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerdson Nascimento de Lima

CREA - 211042483-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira

CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				UNIDADE DE MEDIÇÃO:		Nº	TOTAL:	OBSERVAÇÕES
1.3.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	À MEDIR	LADO
	AV VILLA JARDIM	560,00	6,50			3.640,00	3.640,00	3.640,00		EST. 0+0m A 28+0 m
ACUMULADO ANTERIOR							45.680,73			
MEDIDO NO PERÍODO							3.640,00			
ACUMULADO NO PERÍODO							49.320,73			

Fls. 21494 Proc: 147 18073



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

DECLARO que o serviço pu obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerleon Nascimento de Lima
CREA - 21104248/-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-8 / Matr.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1.4		TERRAPLENAGEM					UNIDADE DE MEDIÇÃO:		m³		TOTAL:		
1.4.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DWT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³											1.024,32	
	TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	OBSERVAÇÕES		
	AV VILLA JARDIM							894,91	894,91		VER QUADRO DE CUBAÇÃO		
	RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO							129,41	129,41		VER QUADRO DE CUBAÇÃO		
ACUMULADO ANTERIOR							52.290,39						
MEDIDO NO PERÍODO							1.024,32						
ACUMULADO NO PERÍODO							53.314,71						



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 28/11/2024 a 10/12/2024

8ª MEDIÇÃO

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerdson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-9 / Mat.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1.4		TERRAPLENAGEM					UNIDADE DE MEDIÇÃO:		m³		TOTAL:	
1.4.2		Espalhamento de material em boca-fora									742,48	
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	OBSERVAÇÕES		
AV VILLA JARDIM							649,72	649,72		VER QUADRO DE CUBAÇÃO		
RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO							92,76	92,76		VER QUADRO DE CUBAÇÃO		
ACUMULADO ANTERIOR							47.490,37					
MEDIDO NO PERÍODO							742,48					
ACUMULADO NO PERÍODO							48.232,85					

* Observação: a rua indicada em trecho significa de onde o material foi escavado, sendo o boca-fora realizado em uma distância de até 1000 a 1200 metros, conforme pago no item 1.4.1.

2496 Proc: 148 18023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 28/11/2024 a 10/12/2024

8ª MEDIÇÃO
ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerdson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 50969847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 5111498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1.4 TERRAPLENAGEM											
1.4.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF - 11/2019											
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	OBSERVAÇÕES	
AV VILLA JARDIM	560,00	6,50				3.640,00	3.640,00			EST. 0+0m A 28+0 m	
RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO	69,36	8,00				554,88	554,88			EST. 0+0m A 3+9,36 m	
ACUMULADO ANTERIOR						133.223,11					
MEDIDO NO PERÍODO						4.194,88					
ACUMULADO NO PERÍODO						137.417,99					
UNIDADE DE MEDIÇÃO:									M²	TOTAL:	4.194,88

Fls. 2994 Proc: 142.18023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO - VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

8ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerdson Nascimento de Lima
CREA - 211042493-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-8 / Mat.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1.5 PAVIMENTAÇÃO											
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019											
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESURA (m)	DESCONTO (m³)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	À MEDIR	LADO	OBSERVAÇÕES	
AV VILLA JARDIM							245,19	245,19		QUADRO DE CUBAÇÃO	
RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO							36,65	36,65		QUADRO DE CUBAÇÃO	
ACUMULADO ANTERIOR							6.447,55				
MEDIDO NO PERÍODO							281,84				
ACUMULADO NO PERÍODO							6.729,39				
TOTAL: 281,84											

Proc: 142.18023
2798



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº. 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 28/11/2024 a 10/12/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alairson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1.5		PAVIMENTAÇÃO				UNIDADE DE MEDIÇÃO:		M²	TOTAL:	OBSERVAÇÕES
1.5.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF-11/2019	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	À MEDIR	LADO
AV VILLA JARDIM		647,58	6,50		0,25		4.209,27	1.052,32	1.052,32	
RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO		89,36	8,00		0,20		554,88	110,98	110,98	
						ACUMULADO ANTERIOR			26.104,23	
						MEDIDO NO PERÍODO			1.163,30	
						ACUMULADO NO PERÍODO			27.267,53	

Fls. 2520 Proc: 142.12023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO		UNIDADE DE MEDIÇÃO:		M²		TOTAL:	
1.5		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022		À MEDIR		10.820,28	
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
RUA JAGUAR	89,40		5,45			487,23	
AV CARLOS LIMA ROCHA	401,48		11,30			4.536,72	
RUA DO PINHÃO	90,00		8,20			738,00	
RUA DA MAMONA	90,00		8,15			733,50	
RUA JOSÉ ELTON RODRIGUES DA SILVA	138,46		6,50			899,99	
RUA JOSÉ ELTON RODRIGUES DA SILVA	280,00		6,50			1.820,00	
RUA JOSÉ ELTON RODRIGUES DA SILVA	341,54		6,50			2.220,01	
RUA JOSÉ ELTON RODRIGUES DA SILVA	60,50		6,50			393,25	
RUA JOSÉ ELTON RODRIGUES DA SILVA	820,50		7,00			5.743,50	
RUA JORGE ALVES DA SILVA	387,50		8,00			3.100,00	
RUA PROJETADA 03	58,00		7,46			432,68	
RUA FRANCISSCO ASSIS DO NASCIMENTO	67,00		5,70			381,90	
				ACUMULADO ANTERIOR		73.353,90	
				MÉDIO NO PERÍODO		10.820,28	
				ACUMULADO NO PERÍODO		84.174,18	

Observações: Informamos que, após verificação, foi constatado um erro na medição da largura da Rua José Elton Rodrigues. Na etapa inicial, a largura havia sido atestada como 6,50 metros. Contudo, durante a execução e aferição final da obra, verificou-se que a largura real executada foi de 7,00 metros. Esse erro foi decorrente de um equívoco na medição enviada pela empresa responsável, o qual foi devidamente corrigido na presente medição.

Pro: 2800 Proc: 149 18073



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

(Assinatura)
Maerson Nascimento de Lima
CREA - 21104243-4 / Mat.: 5096847-2

(Assinatura)
Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1.6 DRENAGEM		Melo-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais				UNIDADE DE MEDIÇÃO:			m		TOTAL: 1.490,00	
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESURA (m)	LADOS	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	OBSERVAÇÕES		
AV CARLOS LIMA ROCHA	90,00				1,00			90,00		EST. 18+0m A 22+10 m		
AV CARLOS LIMA ROCHA	60,00				1,00			60,00		EST. 26+0m A 29+0 m		
AV CARLOS LIMA ROCHA	20,00				1,00			20,00		EST. 30+0m A 31+0 m		
AV CARLOS LIMA ROCHA	100,00				1,00			100,00		EST. 33+0m A 38+0 m		
RUA DO PINHÃO	90,00				1,00			90,00		EST. 36+0m A 40+10 m		
RUA DA MAMONA	90,00				1,00			90,00		EST. 44+0m A 8+10 m		
RUA FRANCISCO MARCEL DE LIMA	15,00				2,00			30,00		TRAVAMEN TO DE RUAS		
RUA JORGE ALVES DA SILVA	380,00				2,00			760,00		EST. 9+0m A 28+0 m		
RUA PROJETADA 03	58,00				2,00			116,00		EST. 0+0m A 2+18 m		
RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO	67,00				2,00			134,00		EST. 0+0m A 3+7 m		
ACUMULADO ANTERIOR								18.017,78				
MEDIDO NO PERÍODO								1.490,00				
ACUMULADO NO PERÍODO								19.507,78				

Pro. 2.802 Proc: 14A 19023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.


Alaerdson Nascimento de Lima
CREA - 211042/83-4 / Mat.: 6096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

1,6		DRENAGEM		UNIDADE DE MEDIÇÃO:		M	TOTAL:	OBSERVAÇÕES		
1,6.3		ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 83718)								
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESURA (m)	LADOS	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	
AV CARLOS LIMA ROCHA	90,00				1,00			90,00		
AV CARLOS LIMA ROCHA	60,00				1,00			60,00		
AV CARLOS LIMA ROCHA	20,00				1,00			20,00		
AV CARLOS LIMA ROCHA	100,00				1,00			100,00		
RUA DO PINHÃO	90,00				1,00			90,00		
RUA DA MAMONA	90,00				1,00			90,00		
RUA JORGE ALVES DA SILVA	380,00				2,00			760,00		
RUA PROJETADA 03	58,00				2,00			116,00		
RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO	67,00				2,00			134,00		
ACUMULADO ANTERIOR								17.186,54		
MEDIDO NO PERÍODO								1.460,00		
ACUMULADO NO PERÍODO								18.646,54		

Fls. 2.803 Proc: 14a 12023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

Alaêrson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

1.8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				UNIDADE DE MEDIÇÃO:		Nº	TOTAL:	OBSERVAÇÕES
1.8.2		LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL								
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	
RUA LAND ROVER	169,12	5,90						997,81		
RUA JAGUAR	169,40	6,00						1.016,40		
RUA INFINIT	169,46	6,00						1.016,76		
RUA FERRARI	169,85	6,13						1.041,18		
RUA MARIA DO CARMO FERNANDES MAIA	740,19	9,50						7.031,81		
RUA NILZA PIRES DE ALMEIDA	804,96	5,00						4.024,80		
ACUMULADO ANTERIOR								43.857,92		
MEDIDO NO PERÍODO								15.128,76		
ACUMULADO NO PERÍODO								58.986,68		



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREGO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024
PERÍODO: 26/11/2024 a 10/12/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 11/12/2024

Declaro que o serviço/obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 21104248-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damtas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511488

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.8.3 RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2100017)												
TRECHO	EXTENSÃO (m)	LARG. INICIAL (m)	LARG. FINAL (m)	ESPESURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	A MEDIR	LADO	UN	TOTAL:	OBSERVAÇÕES
RP_C_01					32,00			32,00				
RP_C_02					60,00			56,00				
RUA LUIZ GONZAGA DO COUTO					6,00			6,00				
RUA JOAO NEPONUCENO DE MOURA					12,00			12,00				
TRAVESSA JOSEFA MARIA DA SILVA					2,00			2,00				
RUA HENRIQUE MENDES					14,00			14,00				
RUA LAMBORGHINI					3,00			3,00				
RUA LADA					4,00			4,00				
RUA EDSON ELIAS BARROS					5,00			5,00				
RUA AMÉLIA SOARES DE MARIA					8,00			8,00				
RUA JOSÉ PEREIRA DE LIMA					6,00			6,00				
RUA LUZIA MARCELINA ALVES					13,00			13,00				
TV FRANCISCO XAVIER DE LIRA					5,00			5,00				
RUA FRANCISCO XAVIER DE LIRA					9,00			9,00				
RUA MARIA JOSILDA DE OLIVEIRA					3,00			3,00				
RUA ALEXANDRE BATISTA DE MORAIS					11,00			11,00				
RUA FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS					5,00			5,00				
RUA DAS TULIPAS					4,00			4,00				
RUA CARMELITA VITOR DA SILVA					2,00			2,00				
RUA ROSA DALIA					3,00			3,00				
RUA AUGUSTO SOARES DA SILVA					4,00			4,00				
TRAVESSA MANOEL BALBINO DA COSTA					6,00			6,00				
RUA JOSÉ JANIIE CAVALCANTE					9,00			9,00				
ACUMULADO ANTERIOR						360,00						
MEDIDO NO PERÍODO						-						
ACUMULADO NO PERÍODO						360,00						

DATA: 26/11/2024 a 01/12/2024

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

Eng. Fiscal: FELIPE AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA

DADOS DA EMPRESA

Empresa executante: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Responsável: BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE

End.: Rodovia BR 110 | KM 52.5, Nº 201 | Alto do Sumaré

ART nº: 20240696350

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Dia da Semana (fiscalizado)							Condições do Tempo			Dados da Execução		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom		Bom	Chuvoso	% EXECUTADA:		
	X	X	X	X	X		Manhã	X		PENDENCIA TÉCNICA SIM NÃO		
							Tarde	X		PENDENCIA FINANCEIRA SIM NÃO		
										ANDAMENTO DA OBRA: NORMAL ATRASADA		

Número de Operários: Profissionais Ajudantes

SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

- *MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE
- *LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
- *CORTE DE RUA
- *REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
- *EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES


*AVENIDA VILLA JARDIM, BOM JESUS.
 *RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO, SUMARÉ.


- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
- *MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
- *ESCORAMENTO DE MEIO FIO

- *RUA JAGUAR - NOVA MOSSORÓ
- *AVENIDA CARLOS LIMA ROCHA - NOVA MOSSORÓ
- *RUA DO PINHÃO - ALTO DAS BRISAS
- *RUA DA MAMONA - ALTO DAS BRISAS
- *RUA JORGE ALVES DA SILVA
- *RUA PROJETADA 03
- *RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO

COMENTÁRIOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ


 Fiscal: Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 Cargo: Diretor de Engenharia 1
 Matrícula: 51149-8


 Empresa: Breno Sávio Bezerra Freire
 Função: Procurador/Responsável Técnico
 CREA-RN nº 211392966-0



CONSTRUTORA LUIZ COSTA

DATA: 02/12/2024 a 08/12/2024

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

Eng. Fiscal: FELIPE AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA

DADOS DA EMPRESA

Empresa executante: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Responsável: BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE

End.: Rodovia BR 110 | KM 52,5, Nº 201 | Alto do Sumaré

ART nº: 20240696350

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Dia da Semana (fiscalizado)							Condições do Tempo			Dados da Execução		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Bom	Chuvoso	% EXECUTADA:			
X	X	X	X	X	X		Manhã	X		PENDENCIA TÉCNICA SIM NÃO		
							Tarde	X		PENDENCIA FINANCEIRA SIM NÃO		
										ANDAMENTO DA OBRA: NORMAL ATRASADA		

Número de Operários: Profissionais Ajudantes

SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

- *MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE
- *LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
- *CORTE DE RUA
- *REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
- *EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES


*AVENIDA VILLA JARDIM, BOM JESUS.
*RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO, SUMARÉ.


- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
- *MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
- *ESCORAMENTO DE MEIO FIO

- *RUA JAGUAR - NOVA MOSSORÓ
- *AVENIDA CARLOS LIMA ROCHA - NOVA MOSSORÓ
- *RUA DO PINHÃO - ALTO DAS BRISAS
- *RUA DA MAMONA - ALTO DAS BRISAS
- *RUA JORGE ALVES DA SILVA
- *RUA PROJETADA 03
- *RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO

COMENTÁRIOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ


Fiscal: Felipe Augusto Dantas de Oliveira
Cargo: Diretor de Engenharia 1
Matrícula: 51149-8


Empresa: Breno Sávio Bezerra Freire
Função: Procurador/Responsável Técnico
CREA-RN nº 211392966-0

DATA: 09/12/2024 a 10/12/2024

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

Eng. Fiscal: FELIPE AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA

DADOS DA EMPRESA

Empresa executante: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Responsável: BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE

End.: Rodovia BR 110 | KM 52,5, Nº 201 | Alto do Sumaré

ART nº: 20240696350

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Dia da Semana(fiscalizado)							Condições do Tempo			Dados da Execução		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Manhã	Bom	Chuvoso	% EXECUTADA:		
X	X						X	X		PENDENCIA TÉCNICA SIM NÃO		
							X			PENDENCIA FINANCEIRA SIM NÃO		
										ANDAMENTO DA OBRA: NORMAL ATRASADA		

Número de Operários: Profissionais Ajudantes

SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

- *MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE
- *LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
- *CORTE DE RUA
- *REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
- *EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES


*AVENIDA VILLA JARDIM, BOM JESUS.
 *RUA FRANCISCO GOMES SOBRINHO, SUMARÉ.


- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
- *MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
- *ESCORAMENTO DE MEIO FIO

*RUA JAGUAR - NOVA MOSSORÓ
 *AVENIDA CARLOS LIMA ROCHA - NOVA MOSSORÓ
 *RUA DO PINHÃO - ALTO DAS BRISAS
 *RUA DA MAMONA - ALTO DAS BRISAS
 *RUA JORGE ALVES DA SILVA
 *RUA PROJETADA 03
 *RUA FRANCISCO ASSIS DO NASCIMFNT0

COMENTÁRIOS :

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ


 Fiscal: Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 Cargo: Diretor de Engenharia 1
 Matrícula: 51149-8


 Empresa: Breno Sávio Bezerra Freire
 Função: Procurador/Responsável Técnico
 CREA-RN nº 211392966-0



MOSSORÓ
PREFEITURA

Fls. 2809 Proc: 142 12023

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA**

ANEXO I - 8ª MEDIÇÃO

MOSSORÓ/RN, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

Assunto: 3ª Justificativa de Fonte de Recursos a Respeito da 8ª Medição
REF: Contrato nº 04/2024 - Processo Administrativo nº 142/2023 - Concorrência nº 14/2023-SEINFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Venho, pelo presente, demonstrar evolução financeira relacionado a fonte de recursos referente ao contrato nº 04/2024 - Processo Administrativo nº 142/2023 - Concorrência nº 14/2023-SEINFRA

	Valores Medidos Acumulados Anterior	Evolução da 8ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Rec. de op. de crédito	R\$ 17.704.364,33	R\$ 1.092.804,83	R\$ 18.797.169,16
Transferência especial	R\$ 761.497,10	R\$ 376.499,37	R\$ 1.137.996,47
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 18.465.861,43	R\$ 1.469.304,20	R\$ 19.935.165,63
Execução Física:	-	2,53%	34,36%

Observações:

Atenciosamente,

FELIPE AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA
Responsável Técnico pela Fiscalização
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498
